

PROGETTO AULE PULITE

I.C. DI VONA - SPERI



RIUNIONE ORGANIZZATIVA
dalle 18.00 alle 19.30
in Auditorium

- **i genitori** delle elementari delle medie nei primi mesi dell'anno scolastico **hanno esposto alla dirigenza scolastica la necessità di una nuova imbiancatura** delle aule scolastiche.
- nella seduta del **Consiglio di Istituto** del 4 febbraio 2015 è stato costituito un **gruppo di lavoro** per regolamentare l'esecuzione dei lavori di imbiancatura delle aule e per valutare:
 - ✓ costi del materiale,
 - ✓ stipula di un'assicurazione per l'esecuzione dei lavori,
 - ✓ possibilità di ottenere un contributo da parte del Comune di Milano,
 - ✓ scelta del colore.
- **componenti** del gruppo di lavoro:
 - per i **docenti**: Nicola Guida (primaria) e Paolo Molena (media)
 - per i **genitori**: Elisabetta Mezzolo (prim.) e Laura Coletta(media)
 - Per la **dirigenza**: il Dirigente Giuseppe Losio e il DSGA Luciano Fani.

- Il gruppo si è riunito il **17 febbraio** e il **18 marzo** e successivamente sono stati fatti diversi sopralluoghi presso le aule delle elementari e delle medie.
- I lavori del gruppo hanno chiarito che:
 - ✓ Il Comune contribuisce al progetto attraverso la fornitura del materiale per l'imbiancatura delle aule dell'Istituto.
 - ✓ La **disponibilità dei volontari** è di **86** per il comitato TS e di **76** per l'Associazione QdV.
 - ✓ l' **assicurazione scolastica** già prevede la **copertura anche per i genitori**, devono solo essere forniti alla compagnia i dati delle persone presenti a scuola nelle giornate dedicate ai lavori.



le 36 aule delle medie



piano	tot. aule
T	4
1°	11
2°	13
3°	8
tot.	36

Alcune aule hanno una cornice in alto, altre no. La parte in basso è smaltata e quella superiore in pittura murale.

Il fissativo/consolidante NON va dato sulle parti smaltate.

in quasi tutte le aule ci sono molte crepe a ragnatela, segni di scotch e aree da da stuccare... in 3 classi ci sono dei murales da coprire



In altre aule gli interventi vanno oltre la piccola stuccatura e il **ripristino murario verrà effettuato da una ditta inviata dal Comune di Milano** che li farà tra il 27 e il 29 aprile in orario pomeridiano.






Le tende sono di varie tipologie, in stoffa a vetro o a bastone, veneziane e in alcune classi soluzioni creative con fogli di giornale a vetro!
Per quelle in stoffa questa sarà un'ottima occasione per essere lavate!
Useremo la lavatrice della scuola.

La scelta del colore


Nella mazzetta colori proposta dalla ditta mandata dal Comune di Milano sono state individuate 3 tinte in base ai colori dalla pavimentazione e delle porte dell'istituto. Il 10 aprile, in un aula al PT, è stata fatta una prova dei colori e nei giorni successivi, sentite diverse persone tra docenti e non, la scelta è concordemente ricaduta sulla tinta B1115

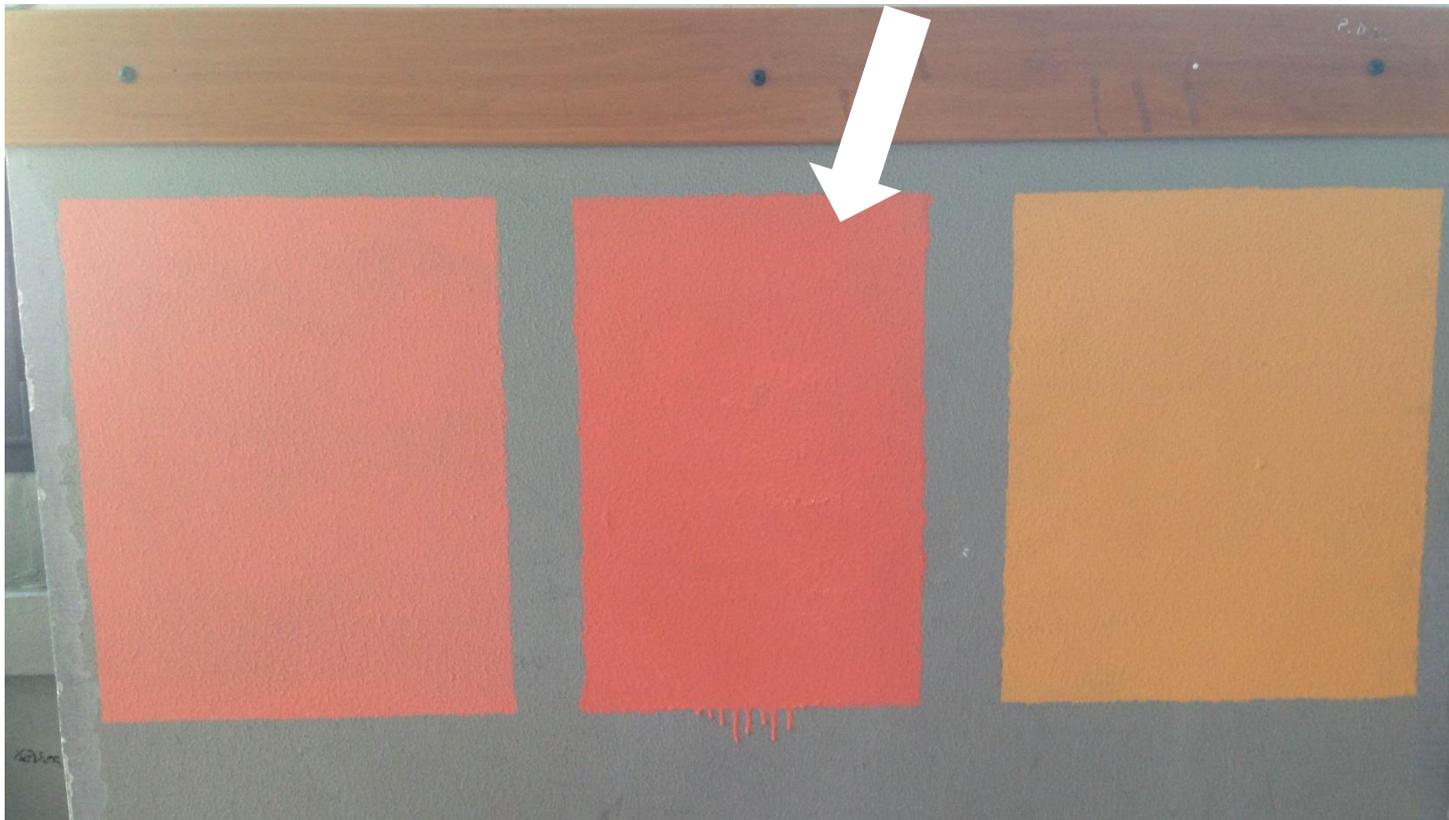


«aule pulite» programmazione dei lavori sulle 36 aule della QdV

aule	pomeriggio 30/04/2015	mattina 01/05/2015		pomeriggio 01/05/2015	mattina 2/5/2015		pomeriggio 01/05/2015	mattina 2/5/2015		pomeriggio 01/05/2015
1	1	1		1		5				
2	2	2		2		6				
3	3	3		3		1				
4	4	4		4		2				
5	5	5		5		3				
6	1	6		6		4				
7	2	7		7		5				
8	3	8		8		6				
9	4		1		1		1			
10	5		2		2		2			
11		1	3		3		3			
12		2	4		4		4			
13		3	5		5		5			
14		4	6		6		6			
15		5	7		7			1		
16		6	8		8			2		
17		1			1		3		1	
18		2			2		4		2	
19		3			3		5		3	
20		4			4		6		4	
21		5			5		1		1	
22		6			6		2		2	
23		1			7		3		3	
24		2			8		4		4	
25		3			1		5			1
26		4			2		6			2
27		5			3		1			3
28		6			4		2			4
29		1			5		3			1
30		2			6		4			2
31		3			7		5			3
32		4			8		6			4
33		5				1		1		1
34		6				2		2		2
35					1	3		3		3
36					2	4		4		4

legenda



preparazione
fissativo/consolidante



1^mano bianco/smalto
2^ mano bianco/colore

Il programma dei lavori per le medie

- **nella settimana dal 20 al 24 aprile:**
docenti e alunni libereranno le pareti dai lavori appesi ai muri e svuoteranno i loro armadi.

ATTENZIONE: ai **rappresentanti** di classe verrà chiesto di collaborare fornendo già da **lunedì 20** un adeguato numero di **scatoloni** per il materiale didattico attualmente contenuto nei 2 – 3 della propria classe.



Il programma dei lavori per le medie

- **giovedì 30:** dalle 14:30 alle 18:30 alcune squadre di volontari prepareranno una decina di aule (l'elenco preciso delle aule verrà indicato nei giorni precedenti i lavori):



- **stuccando** dove necessario,
- rimuovendo le **tende in stoffa** (da mettere in sacchetti per l'invio al lavaggio)
- **coprendo con teli** di plastica le lavagne, gli infissi, i caloriferi
- **nastrand** le parti da proteggere dall'imbiancatura (parte alta cornice o controsoffitto, parte superiore e inferiore delle bordature in legno, parte in alto della zoccolatura)
- **spostando gli arredi** al centro della stanza e in corridoio, se necessario.

aule	pomeriggio	mattina 01/05/2015	
	30/04/2015		
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	1	6	6
7	2	7	7
8	3	8	8
9	4		1
10	5		2
11		1	3
12		2	4
13		3	5
14		4	6
15		5	7
16		6	8
17		1	
18		2	
19		3	
20		4	
21		5	
22		6	
23		1	
24		2	
25		3	
26		4	
27		5	
28		6	
29		1	
30		2	
31		3	
32		4	
33		5	
34		6	
35			
36			

venerdì 1° Maggio – nella mattina

- le **6 squadre** di preparazione prepareranno 6 aule
- le **8 squadre** di imbiancatura, composte da 3 volontari ciascuna inizieranno in contemporanea a dare la mano di **fissativo / consolidante** nelle 8 aule preparate il giorno precedente.
- **finita la prima fase**, le squadre di preparazione passeranno ad altre aule e quelle di imbiancatura si sposteranno nelle nuove 8 aule preparate per dare la mano di fissativo/consolidante
- **finita la seconda fase** le squadre di preparazione passeranno ad altre aule e quelle di imbiancatura a dare la prima mano alle prime aule

legenda



preparazione

fissativo/consolidante



1^ mano bianco/smalto


2^ mano bianco/colore

	pomeriggio
aule	01/05/2015
9	1
10	2
11	3
12	4
13	5
14	6
15	7
16	8
17	1
18	2
19	3
20	4
21	5
22	6
23	7
24	8
25	1
26	2
27	3
28	4
29	5
30	6
31	7
32	8
33	
34	
35	1
36	2

venerdì 1° Maggio – nel pomeriggio


- **2 squadre** di preparazione prepareranno le ultime 2 aule se non già preparate nella mattina
- le **8 squadre** di imbiancatura, proseguiranno a dare la prima mano alle successive 8 aule
- finita la prima mano alle prime 16 classi, le squadre di imbiancatura passeranno in nuove 8 aule preparate per dare la mano di fissativo/consolidante
- finita la seconda fase le squadre di preparazione passeranno ad altre aule e quelle di imbiancatura a dare la prima mano alle prime aule

legenda



preparazione

fissativo/consolidante



1^ mano bianco/smalto


2^ mano bianco/colore

aule	mattina 2/5/2015	
1	5	
2	6	
3	1	
4	2	
5	3	
6	4	
7	5	
8	6	
9		1
10		2
11		3
12		4
13		5
14		6
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33	1	
34	2	
35	3	
36	4	

sabato 2 Maggio – nella mattina


- **delle 6 squadre** di imbiancatura, composte da 3 volontari ciascuna 4 squadre daranno la mano di **fissativo / consolidante** nelle ultime 4 aule preparate il giorno precedente e le altre 2 la seconda mano di bianco/smalto nelle prime due aule
- **finita la prima fase**, le 6 squadre di imbiancatura si sposteranno nelle successive 6 aule per dare la seconda mano di bianco/smalto
- **finita la seconda fase** le 6 squadre di imbiancatura si sposteranno nelle successive 6 aule per dare la seconda mano di bianco/smalto

legenda



preparazione

fissativo/consolidante



1^mano bianco/smalto


2^ mano bianco/colore

sabato 2 Maggio – nel pomeriggio

aule	pomeriggio o 01/05/2015
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	1
16	2
17	3
18	4
19	5
20	6
21	1
22	2
23	3
24	4
25	5
26	6
27	1
28	2
29	3
30	4
31	5
32	6
33	
34	
35	
36	


- la **squadra** (*criticità per presenza di pochi volontari*) per la preparazione potranno iniziare a ripristinare le prime 16 aule
- **delle 6 squadre** di imbiancatura, 2 daranno 2 la seconda mano di bianco/smalto alle due aule rimanenti, le altre 4 squadre daranno la 1 mano di bianco/smalto
- **finita la prima fase**, le 6 squadre di imbiancatura si sposteranno nelle successive 6 aule per dare la prima mano di bianco/smalto
- **finita la seconda fase** le 6 squadre di imbiancatura si sposteranno nelle successive 6 aule per dare la prima mano di bianco/smalto

legenda



preparazione

fissativo/consolidante



1^mano bianco/smalto

2^ mano bianco/colore

aule	mattina 2/5/2015	pomeriggio o 01/05/2015
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17	1	
18	2	
19	3	
20	4	
21	1	
22	2	
23	3	
24	4	
25		1
26		2
27		3
28		4
29		1
30		2
31		3
32		4
33	1	1
34	2	2
35	3	3
36	4	4

domenica 3 Maggio – mattina/pomeriggio


- **le 4 squadre** di imbiancatura, partiranno col dare la prima mano di bianco/smalto alle ultime 4 aule rimanenti,
- **finita la prima fase**, le 4 squadre si sposteranno a rotazione a dare la seconda mano di bianco/smalto alle successive 8 aule
- **nel pomeriggio** le 4 squadre di imbiancatura si sposteranno nelle successive 8 aule per finire la seconda mano di bianco/smalto
- la **squadra** (*criticità per presenza di pochi volontari*) per la preparazione potranno iniziare a ripristinare le aule che man mano vengono pronte

legenda



preparazione

fissativo/consolidante



1^mano bianco/smalto

2^ mano bianco/colore

attrezzatura necessaria per l'imbiancatura

- SPATOLE
- PENNELLI
- PENNELLESSE
- PROLUNGA PER RULLI
- RULLI per smalto
- RULLI PER idropittura
- RETE PER RULLI Cm 25X25
- SECCHI PER MISCELARE IL MATERIALE
- TRABATELLI

Sulla base del materiale reperito tra genitori ed insegnanti, avremo un'idea del quantitativo di attrezzi mancanti da acquistare a spese dell'associazione e del Comitato.

SI RICORDA che a fine lavori ognuno potrà recuperare il proprio materiale!



attrezzatura reperita e da reperire

attrezzatura in prestito:

Elenco materiale dei volontari:	
1 trabatello, 2 rulli per idropittura, 2 bastoni prolunga per rullo, 2 pennellesse, 3 pennelli, 1 rete per rulli	Laura Trasi (2 N)
3 rulli per idropittura 2 pennelli 3 pennellesse 2 reti	Francesco Truci (2 B)
1 penellessa, 1 rullo 1 bastone 1 secchio	Carlo Vaiani (2N)
2 spatole (di quelle non molto grandi con manico) 1 rullo per idropittura in discrete condizioni (+ rulli piccoli per bordi/finiture) 1 Rete per rulli 1 Scala	Andrea Bignazzi (1)

maggior materiale reperiremo e minore sarà l'importo a cui dovranno far fronte associazione e comitato per l'acquisto dell'attrezzatura.

ATTENZIONE: termine ultimo per comunicare la disponibilità di attrezzatura

venerdì 24 aprile

occorrenti	materiale dei genitori	n.	da acquistare	prev.
8	PENNELLO	5	3	€ 10,46
8	PENNELLESSA	6	2	€ 10,43
16	PROLUNGA RULLO	3	13	€ 50,56
16	RULLO RASATO per smalto		16	€ 96,00
24	RULLO POLYAM PER idropittura	7	17	€ 284,07
16	RETE PER RULLO Cm 25X25	4	12	€ 32,26
16	SECCHI PER MISCELARE IL MATERIALE	1	15	€ 21,59
10	SPATOLA	2	8	€ 11,51
	Spesa preventivata			€ 505,36
	TRABATELLO	1		
	SCALA	1		

Volontari per le fasi di preparazione e post imbiancatura

	gruppo	classe	nome	cognome	30-apr	01-mag	02-mag	03-mag	
1	1	1N	LAURA	CARA	1	1	1*		
2	1	2A	NORBERTO	VILLA	1	1	1*		
3	1	1E	FRANCESCA	LISE	1				
4	1	1G	LAURA	ZOLLO				1	
5	1	2G	CARLOS FEDERICO	TIRADO GUTIERREZ				1	
6	2	1D	SILVIA	SISTI		1			
7	2	1D	GIANFRANCO	BECCIU		1			
8	2	3D	DANIELA	CATTANEO		1			
9	2	1N	MARTINA	VIKTORINOVA		1			
10	3	3C	JENNIFER	FERLEZ	1*	1			
11	3	3C	GIOVANNA	LANCIANO		1			
12	3	1F	FRANCESCA	FEDERICI		1			
13	3	1F	FULVIO	ZANESSI		1			
14	4	2H	ALESSANDRO	BORRONI		1			
15	4	2D	MAURIZIO	BELMUSO		1			
16	4	2D	ANNA	CARUSI		1			
17	4	2N	BARBARA	CORSI		1			
18	5	1N	GIULIA	LABELLA	1*	1			
19	5	2C	NICOLETTA	COSSIO		1			
20	5	2C	LUCIANO	MARINO		1			
21	5	1C	RAFFAELE ROBERTO	FARINA		1			
22	6	3B	SIMONA	PALERMO	1	1			
23	6	1I	CINZIA ERMINIA	CALLEGARO		1			
24	6	1B	EDA	BERTOSSI	1	1			
25	6	1L	ANTONIO GIOVANNI	BANAL	1				
26	7	3M	ROSSELLA	AZZOLINI	1		1		
27	7	2L	LUCIA	VILLANOVA	1*		1		
28	7	1F	SIMONA	TRADATI	1				
29	7	1L - 3L	GIUSEPPE	PAOLETTI	1				
30	8	1L - 3L	FRANCESCA	PERUGINO	1				
31	8	1L	Natalia	D'Ambrosio	1				
32	8	1L	Attilio	De Gennaro	1				
33	8	1L	Alessandro	De Gennaro	1				
34	9	3H	LUISA	BONGIONI	1				
35	9	3H	CHIARA	BERARDI	1				
36	36	3I -2I	ANGELA	CATURANO			1	1	
					tot.	15	21	2	2

* da confermare

n° squadre	4/5	6	2	1
------------	-----	---	---	---

Volontari per l'imbiancatura

	gruppoclasse	nome	cognome	01-mag	02-mag	03-mag	
1	1	3M	GIOVANNI	MARAZZA	1	1	1
2	1	1I	ALDO	FUGAZZA	1		1
3	1	2M	PAOLA	PRONI	1		1
4	1	3G	OMAR	RICO PATINO	1		
5	1	1A	SAVERIO FRANCESCO	RUSSO		1	
6	1	1G	MAURIZIO	TOLOI		1	
7	1	1L-G	STIJN	VRIENDS			
8	2	2B	FRANCESCO	TRUCI	1	1	1
9	2	1E	MATTEO	CASTELLUCCI			1
10	2	1M	NICOLETTA	MONETA		1	
11	2	2D	MARCO	CAPOZZI	1		
12	2	3D	RAUL WILSON	ABANTO PALOMINO			1
13	2	3H	CHIARA	BERARDI	1*		
14	2	2G	PASQUALE	DI MONACO	1	1	
15	3	1G	MASSIMO	BOLCATO	1	1	1
16	3	1G	MATTEO GIOVANNI	BRIOLA	1	1	
17	3	3B	MONICA	ANGELONI	1	1	
18	3	1E	MATTEO	CASTELLUCCI			1
19	3	1D	AHMED ABDELGHANI KHALIL	IBRAHIM			1
20	4	2L	STEFANIA	BENINI	1	1	1
21	4	1F	ROBERTO	ASPES			1
22	4	1E	RAFFAELE	REGGIO	1		
23	4	1E	GIULIA	TAMAI			1
24	4	1I	ANDREA	BIGNAZZI	1	1	
25	4	2E	FILIPPO	MURA		1	
26	5	1F	SIMONA	TRADATI	1	1	1
27	5	1A	GIUSEPPE	VICENTI	1	1	
28	5	1A	VIVIANA	BERTACCA	1	1	
29	6	1N	LUCA	VESPIGNANI	1	1	
30	6	1F	GABRIELLA	CRESPI	1		
31	6	1F	MASSIMO	MOIOLI	1		
32	6	1H	ROCHI FEBO	DOMMARCO		1	
33	6	1H	ANTONIO	SISINNI		1	
34	7	1A	CLAUDIA	FUSI	1		
35	7	2N	LAURA MARIA	TRASI	1		
36	7	1B	MAURIZIO	FLOREAN	1		
37	8	1F	ANDREA	DELLA SANTA	1		
38	8	2C	GIULIANO	CIPOLLETTA	1		
39	8	2N	CARLO	VAIANI	1		
40	8	2N	ANTONINO	CINGARI			
				tot.	25	18	13

* da confermare

n° squadre	8	6	4
------------	---	---	---
